


Stavba: „Vypouštění odpadních vod“ Elektrárna Štěchovice	Objednatel: ČEZ, a.s. Duhová 2/1444 140 53 Praha 4	Doba výstavby: 10/2010 až 12/2010 Cena díla: 889.764,- Kč
---	---	---

Popis prací: provedení stavebních úprav a sanace stávající akumulční jímky, její vystrojení novou čerpací technikou. Z této jímky jsou odpadní splaškové vody přečerpávány výtlačným potrubím do stávající gravitační kanalizace v budově vrátnice, odkud natékají do obecního kanalizačního řádu. Potrubí výtlačku je vedeno prostorami podzemního podlaží elektrárny, dále vnitřním instalačním kanálem (v podlaze kabelového kanálu), který na hranici budovy elektrárny přechází v panely zakrytý vnější instalační kanál končící u budovy dílny. V dílně je potrubí vyvedeno pod strop objektu a následně prochází do umývacího koutu v přízemí budovy vrátnice, kde je napojeno do stávající gravitační kanalizace. V prostoru vnějšího instalačního kanálu je potrubí výtlačku tepelně izolováno vnějším izolačním pouzdrem a pro zabezpečení v zimních měsících je potrubí opatřeno topným kabelem s automatikou spínání.



Ukládání prefabrikovaného stropu jímky

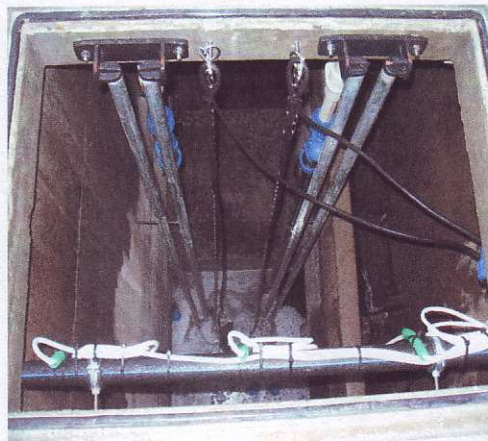

Pohled do jímky po osazení a propojení technologie



Pohled na odkrytou čerpací jímku, v pozadí objekt přehrady



Trasa výtlačné kanalizace v dílně, vedená pod stropem

Potvrzení objednatele : ČEZ, a.s.
 Duhová 2/1444, Praha 4

Potvrzujeme, že společnost WALCO CZ, s.r.o. pro nás provedla zde popsané práce v požadované kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a ČSN. Práce byly řádně a odborně provedeny v dohodnutých smluvních termínech, předány byly bez závad a připomínek.

Za objednatele :

Datum : 2.5.2011

Podpis : 
